


# BG16RFPR002-2.010-0001 „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1)“

Бенефициент: Министерство на електронното управление

Консултант: Международна банка за възстановяване и развитие

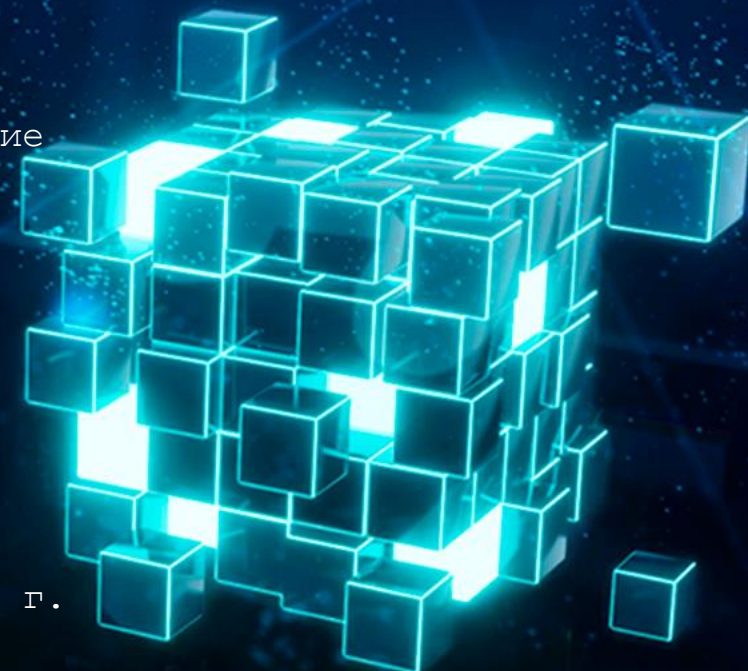

22 ноември 2024 г., Пето заседание на КН на ПНИИДПТ 2021–2027 г.

*Проект BG16RFPR002-2.010-0001 „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1) по административен договор № BG16RFPR002-2.010-0001-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран от програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие*

# Съдържание

1. Параметри на проекта
2. Дейности, резултати, крайни срокове и статус
3. Индикатори по проекта
4. Обвързаност на проекта с останалите дейности по програмата
5. Изпълнение и напредък по проекта

# Параметри на проекта


- **Дата на подписване на административния договор за директно предоставяне на БФП № BG16RFPR002-2.010-0001-C01:** 23 юли 2024 г.
- **Бенефициент:** Министерство на електронното управление
- **Продължителност:** 24 месеца (Период на изпълнение 01.01.2024 г. до 31.12.2025 г.)
- **Обхват на проекта:** Дейност D1 по приоритет 2 на програмата ПНИДИТ
- **Цел на проекта:** Изграждане на стратегическа, институционална, техническа и законодателна рамка, необходими за ускоряване на цифровата трансформация в страната чрез създаване на система за управление на данни в България и изграждане на ориентирани към потребителите пространства за данни
- **Допълнително сключено споразумение за консултантски услуги:** 21 май 2024 г.
- **Продължителност:** 19 месеца (до декември 2025 г.)
- **Консултант:** Международна банка за възстановяване и развитие
- **Цел:** оказване подкрепа на МЕУ при създаването на институционална, регулаторна и техническа рамка, необходима за укрепване на системите за управление на данни и разработване на ориентирани към потребителите пространства за данни, в т.ч. подкрепа на МЕУ при изпълнението на ангажиментите по програмата и предаване на „know-how“ и изграждане на капацитет в МЕУ

# Деятности, резултати, крайни срокове и статус

Деятности	Договорени резултати, крайни срокове и статус	График и очаквана крайна дата																							
		ЯН '24	ФЕ '24	МАР '24	АПР '24	МАЙ '24	ЮН '24	ЮЛ '24	АВГ '24	СЕП '24	ОКТ '24	НОЕ '24	ДЕК '24	ЯН '25	ФЕ '25	МАР '25	АПР '25	МАЙ '25	ЮН '25	ЮЛ '25	АВГ '25	СЕП '25	ОКТ '25	НОЕ '25	ДЕК '25
<b>Деятност 1:</b> Анализ и оценка на наличността на данни и процесите на управление на данни на национално ниво	Доклад за извършен анализ на пропуските в политиката за управление на данните (01/2024-08/2024), МЕУ, приключила	до август 2024 г																							
<b>Деятност 2:</b> Оценка на потенциала по домейни на пространствата от данни	Доклад относно потенциалната оценка на домейна на пространството от данни (06/2024-01/2025), МБВР, в изпълнение	до януари 2025 г																							
<b>Деятност 3:</b> Оценка на управлението на данните	Доклад относно управлението на данните и пространствата от данни (01/2025-04/2025), МБВР, предстояща	до април 2025 г																							
<b>Деятност 4:</b> Референтна национална рамка за управление на данни	Доклад относно предложена референтна национална рамка за управление на данни (06/2024-04/2025), МБВР, в изпълнение	до април 2025 г																							
<b>Деятност 5:</b> Оценка на готовността на пространството от данни и определяне на приоритетите	Доклад за техническа оценка на пространствата от данни и приоритизиране (03/2025-12/2025), МБВР, предстояща	до декември 2025 г																							
<b>Деятност 6:</b> Пътни карти на пространствата от данни по домейни	Предложени пътни карти за разработването на избраните пространства от данни - (05/2025-12/2025), МБВР, предстояща	до декември 2025 г																							
<b>Деятност 7:</b> Повишаване на капацитета в областта на управлението на данните	Повишаване на капацитета на МЕУ в областта на управлението на данните чрез привличане на 10 бр. ИКТ експерти (11/2025-12/2025), МЕУ, в изпълнение	до декември 2025 г																							

# Индикатори по проекта

- **Индикатор 1:** Приета национална стратегия за данните
- **Индикатор 2:** Изготвена национална рамка за управление на данните

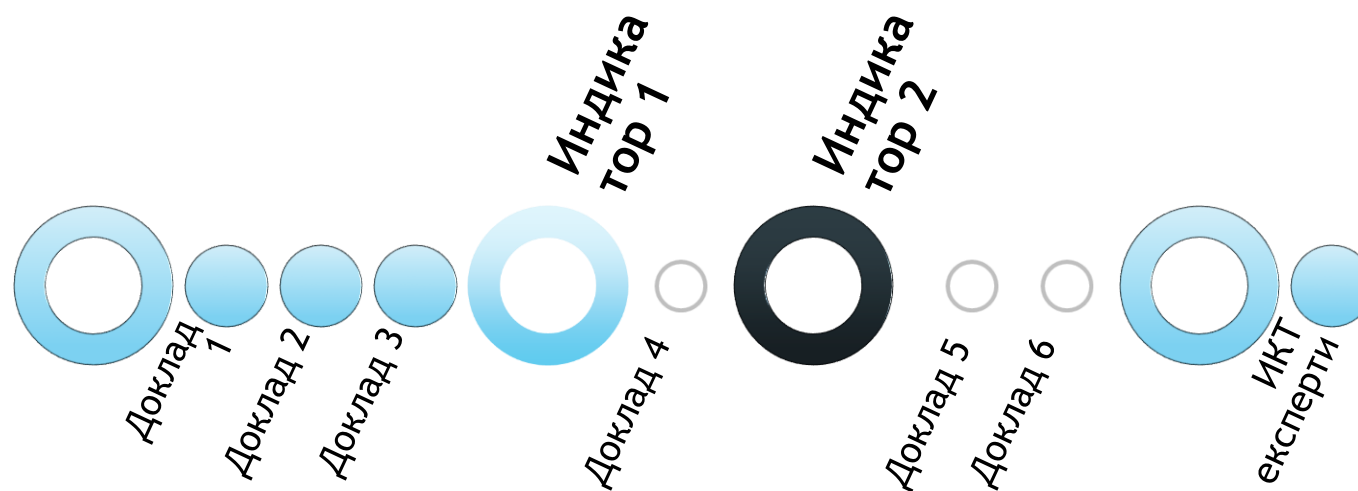

# ПН 1 "Данните като ключов капитал на обществото"

D1

Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните

D2

Изграждане, укрепване и развитие на капацитет в областта на данните

D3

Изграждане на пространства на данни по стратегически сектори

D7

Популяризиране потенциала за създаване на добавена стойност чрез използване и преизползване на данни

D4

Единна уеб-базирана платформа (one stop-shop) за достъп до данни и инструментариум за работа с тях

D5

Решения за обработка на данни и извличане на знание

D6

Развитие на трансгранични услуги за използване и споделяне на данни и интеграция с облачни инфраструктури на европейско ниво

# Напредък по дейностите в обхвата на проекта със СБ

Дейности	Договорени резултати, крайни срокове и статус	График и очаквана крайна дата																	
		МАЙ '24	ЮН '24	ЮЛ '24	АВГ '24	СЕП '24	ОКТ '24	НОЕ '24	ДЕК '24	ЯН '25	ФЕВ '25	МАР '25	АПР '25	МАЙ '25	ЮН '25	ЮЛ '25	АВГ '25	СЕП '25	ОКТ '25
<b>Дейност 2:</b> Оценка на потенциала по домейни на пространствата от данни <span style="color: green;">в процес на изпълнение, по план</span>	Доклад относно потенциалната оценка на домейна на пространството от данни (краен срок: 21 януари 2025), МБВР, в изпълнение	до ян 2025																	
<b>Дейност 3:</b> Оценка на управлението на данните	Доклад относно управлението на данните и пространствата от данни (краен срок: 15 април 2025), МБВР, предстояща	до апр 2025																	
<b>Дейност 4:</b> Референтна национална рамка за управление на данни <span style="color: green;">в процес на изпълнение, по план</span>	Доклад относно предложена референтна национална рамка за управление на данни (краен срок: 15 април 2025), МБВР, в изпълнение	до апр 2025																	
<b>Дейност 5:</b> Оценка на готовността на пространствата от данни и определяне на приоритетите	Доклад за техническа оценка на пространствата от данни и приоритизиране (краен срок: 21 декември 2025), МБВР, предстояща	до дек 2025																	
<b>Дейност 6:</b> Пътни карти на пространствата от данни по домейни	Предложени пътни карти за разработването на избраните пространства от данни - (краен срок: 21 декември 2025), МБВР, предстояща	до дек 2025																	

Настоящ етап



# Преглед на Дейност 2

## Цел

- Оценка на високо равнище на 9 сектора и препоръки за бизнес сценарии (use cases) и пилотни проекти
- Въз основа на международен опит и бърза оценка на осъществимостта ще бъде направена препоръка да се разработи едно пространство от данни („пилотно пространство от данни“)

## Срокове

- Дейности по Дейност 2: юни 2024 г. – януари 2025 г.
- Очаквана крайна дата: 8 месеца след подписването на споразумението (21 януари 2025 г.)





# Дейност 2: Статус

## ■ Дейност 2.1 (завършена)


Преглед на международния опит в разработването на пространства от данни и формиране на препоръка за 9 сектора и/или домейни с потенциал за пространства от данни („целеви сектори“), въз основа на подхода на ЕС, отразен в Европейската стратегия за данните, Акта за управление на данните на ЕС, международен опит, стратегическата и икономическа рамка на България

## ■ Дейност 2.2 (текуща)

Бърза задълбочена оценка на осъществимостта на двете пространства от данни с най-голям потенциал и препоръка за пространство от данни, което може да бъде разработено първо („пилотно пространство от данни“)

## ■ Дейност 2.3 (текуща)

Оценка на високо ниво на предлагането и търсенето на данни в целевите 9 сектора с

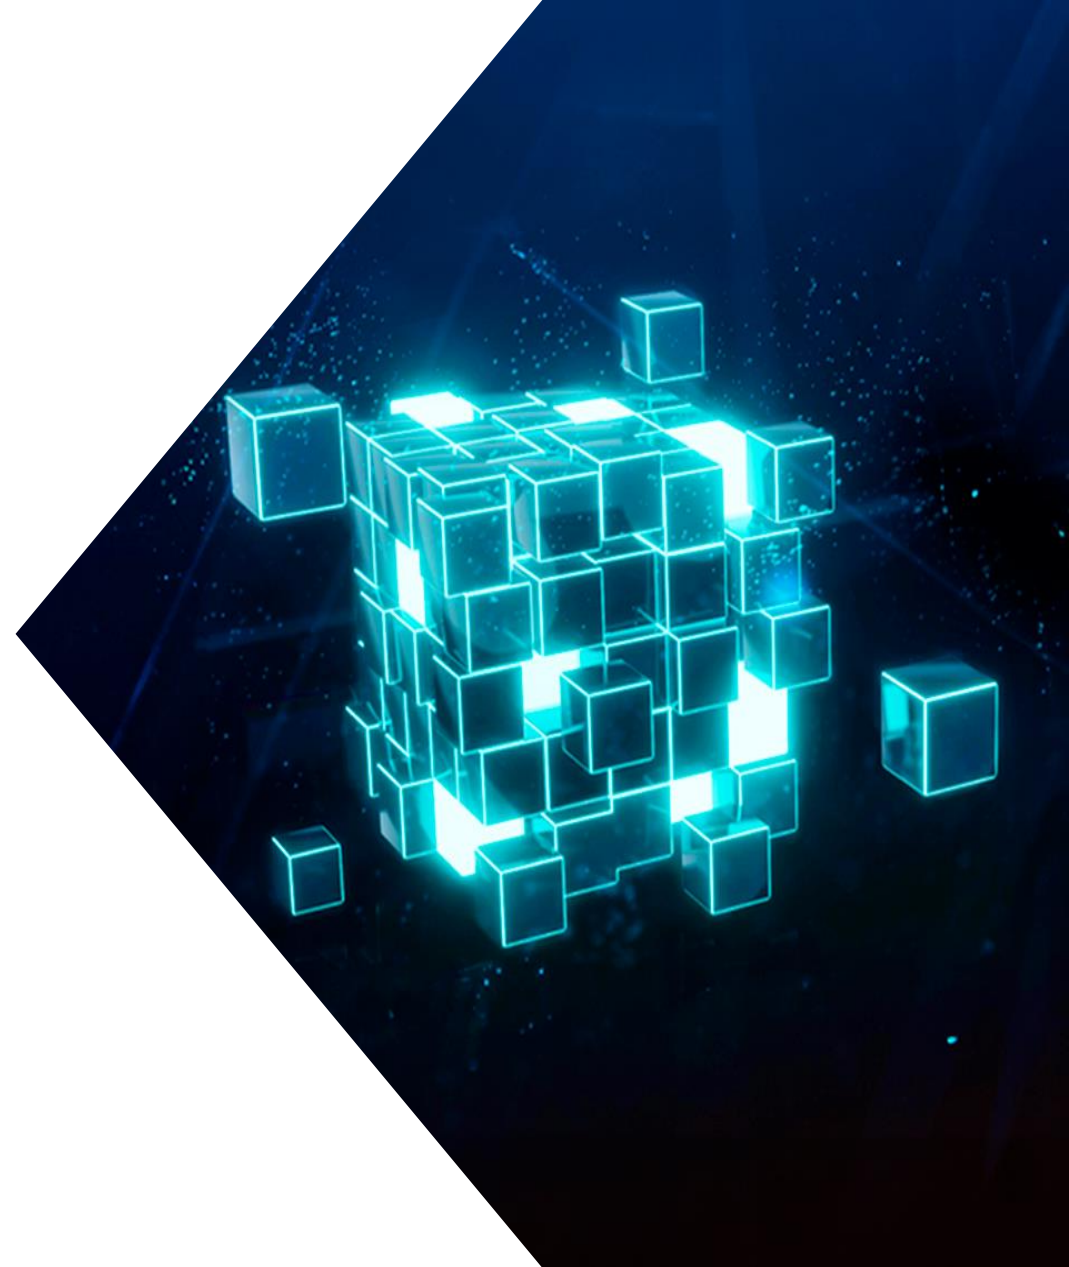

# Дейност 2:

## Методология

Оценка на високо равнище на 9 сектора,  
базирана на три стълба:

### Екосистема

Заинтересованите страни в сектора:

- могат ли да си сътрудничат?
- имат ли опит в обмена на данни?
- имат ли ясни приоритети за видовете данни, които биха им били полезни?

### Наличност на данни

- Съществуват ли разнообразни и качествени данни, които могат да бъдат включени в пространството за данни?

### Търсене на данни

- Заинтересованите страни имат ли нужда от повече споделени данни и свързват ли ги споделени цели и бизнес сценарии за прилагане?



Работни инструменти:

### Кабинетно проучване

- Базово проучване на наличността на данни за всеки сектор

### Интервюта с ключови заинтересовани страни

- Избрани интервюта за формиране на нашето разбиране за динамиката на сектора, бизнес сценариите и наличността на данни

### Дискусии на кръгли маси:


- Дискусии с представители на академичните среди, частния сектор и НПО за подробно разработване на бизнес сценариите

### Проучване:

- Подробно проучване – въпросници, изпратени на министерствата и публични институции

# Дейност 2: Кръгли маси

Дата	Сектор
2 Окт	Здравеопазване
3 Окт	Транспорт
15 Окт	Образование
16 Окт	Туризъм
17 Окт	Регионално развитие
18 Окт	Околна среда
22 Окт	Енергетика
23 Окт	Земеделие
23 Окт	Води

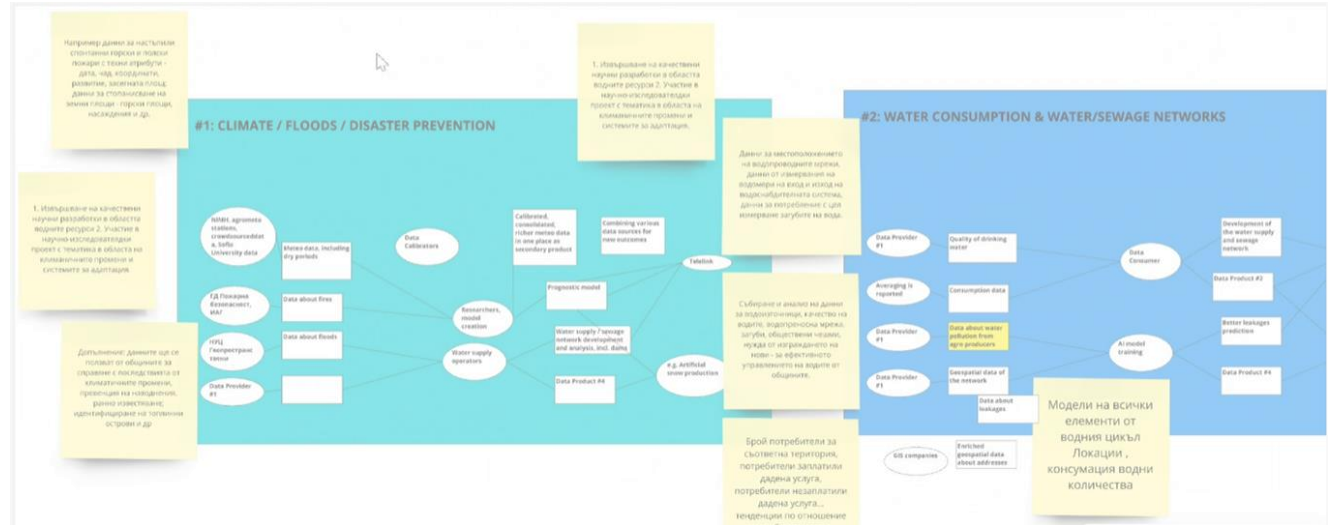

- Участници:** Академична общност, НПО, асоциации на бизнеса и доставчиците на услуги, както и представители на МЕУ (в ролята на наблюдатели)
- Формат:** Половиндневна присъствена «брейнсторминг» среща в офиса на СБ за обсъждане на потенциални бизнес сценарии за пространства от данни във всеки сектор
- Резултат:** потенциални бизнес сценарии, които ще бъдат представени на МЕУ, заедно с анализ на резултатите от дълбочинните интервюта и проучването сред публични институции

# Проучване сред публични институции

## Цели :

Резултатите от проучването се използват за оценка на високо равнище на търсенето и предлагането на данни в разглежданите 9 сектора в България

## Методология :

Проучване сред публичните институции с 30 въпроса в 4 раздела :

- преглед на сектора
- използване на данни от институцията
- опит в споделянето на данни
- нагласи за споделяне на данни

ЛimeSurvey

Load unfinished survey Език: Български - Български

Език: Български - Български Change the language

### Въпросник за представители на администрацията

Световната банка, от името на Министерството на електронното управление, провежда проучване относно потенциала за пилотно въвеждане на пространство за данни по сектори в България. Пространството за данни свързва организации от частния сектор, представители на академичните среди и гражданското общество, както и публични институции, така че те да могат да споделят данни помежду си и да работят заедно за преодоляване на ключови предизвикателства.

Участниците в пространството за данни имат пълен контрол върху своите данни, условията, при които ги споделят с други, както и върху това кои организации могат да виждат и използват предоставените от тях данни. Всички споделяния на данни в рамките на пространството за данни се извършват по надежден и сигурен начин. Пространството за данни помага на участниците да установят трайни връзки помежду си и да работят заедно за преодоляване на общи предизвикателства или за постигане на съвместни цели. От технологична гледна точка пространствата на данни спомагат за въвеждането на единни механизми за откриване, обмен и генериране на добавена стойност на данните, включително чрез съответното законодателство.

Държавните органи могат да участват в пространство от данни, като обменят част от данните, върху които имат права, с други участници и като използват данни, предоставени от други участници, в помощ на иноваторски проекти. Например, държавните и обществените институции участват в австрийското пространство за данни в областта на туризма като предоставят данни за продажбата на билети за обществени музеи и паметници. Тези данни се използват от туристическите компании и туроператорите, за да регулират потока от туристи в и извън популярните зони и да намалят претоварването. Правителството може също да подкрепя и улеснява сътрудничеството между организацията в пространството от данни за спяване с ключови ползвателства.

В рамките на Програма за управление на данни Това следва да осигури необходимите съображения

Данните представлява управлени от държа на образованието, нив данни от регистри, но н

ЛimeSurvey

Продължи по-късно Излизане и изчистване на проучването Език: Български - Български

### Част I: Общ преглед на сектора

● Моля, отбележете сектора на дейност на институцията, в която работите?


● Изберете един от следните отговори.

- „Транспорт“
- „Здравеопазване“
- „Образование“
- „Околна среда“
- „Туризм“
- „Регионално развитие“
- „Енергетика“
- „Водн“
- „Селско стопанство“

## Преглед на Дейност 3

### Цел

- Разработване на предложен набор от критерии за подбор, за да се подпомогне приоритизирането на пространствата от данни за разглеждане и одобрение от МЕУ
- Препоръки за деветте пространства от данни с най-висок потенциал, които да бъдат разработени в рамките на програмата, четири (4) от които се очаква да бъдат приоритизирани в Дейност 5
- Предоставяне на препоръки за подготвянето на Национална стратегия за данни
- Изготвяне на пътна карта на високо ниво за развитието на пространствата от данни в България
- Дейности по Дейност 3: януари 2025 г. – април 2025 г
- Очаквана крайна дата: 11 месеца след подписването на (15 април 2025 г.)

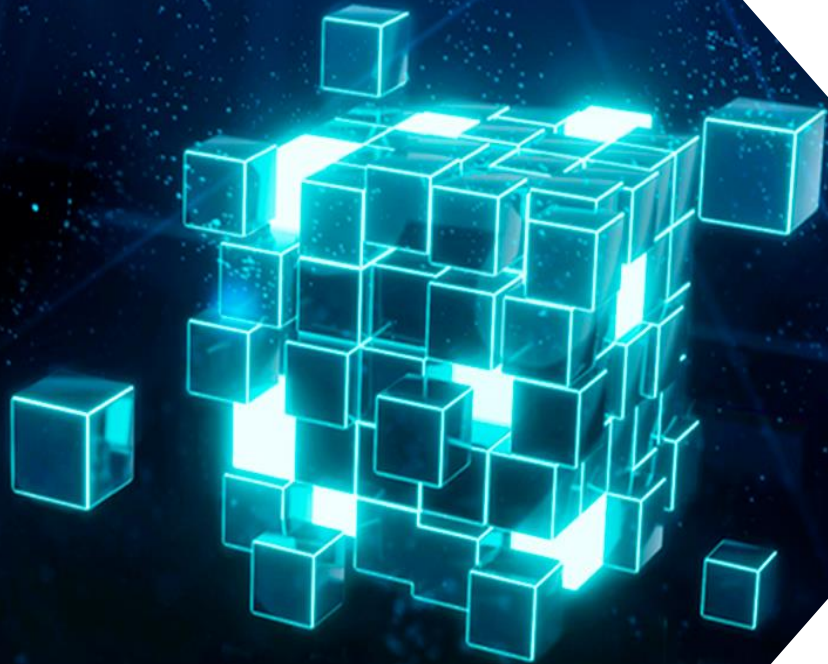



# Преглед на Дейност 4

## Цел

- Разработване на **Национална референтна рамка за управление на данните** (НРУД), която е:
  - в съответствие с Акта за управление на данните на ЕС и приложимото европейско законодателство
  - ще обхване най-добрите световни практики както по отношение на съдържанието, така и по отношение на нейното разработване и поддържане
  - с акцент на лидерството, управлението и ангажирането на заинтересованите страни
- **Препоръки за потенциални законодателни и регулаторни реформи**
- **Оказване подкрепа на процеса на консултации**, организиран и ръководен от МЕУ

## Срокове

- Дейности по Дейност 4: юни 2024 – април 2025
- Очаквана крайна дата: 11 месеца след подписването (15 април 2025 г.)

## Дейност 4: Статус (Детайли)

### ■ **Предложение за структура на доклада (приключено)**

- съгласувана с МЕУ, след предварителни обсъждания с национални заинтересовани страни, Група за данните в Световната банка, Генерална дирекция за цифрови услуги (DIGIT) и Генерална дирекция за комуникационни мрежи, съдържание и технологии (DGConnect)

### ■ **Преглед на международния опит (приключено)**

- проучване на международния опит и литература и научни статии
- включване на местни и глобални примери за добри практики към финалния проект

### ■ **Проект на Национална референтна рамка за управление на данните (НРУД)**

- Работна среща със служители, отговорни за отворени данни и за защита на данните
- Срещи с ключови заинтересовани страни
- Финализиране на проект на НРУД
- Съпътстващи части, включително цялостна пътна карта за предложението за изпълнение; и метрики (KPI) за всеки елемент, за проследяване на напредъка



- **Обучение** на служители на МЕУ на тема управление на данни

- **Инструментариум за самооценка** относно управлението на данни за дейност 5

- **Подкрепа за публични консултации** по проекта на рамка (водени от МЕУ)



# Преглед на Дейност 5

## Цел

- Извършване на техническа оценка на:
  - **осъществимостта на предоставянето на данни** за изграждане на деветте пространства от данни, идентифицирани в Дейност 3
  - **текущата организационна и техническа готовност**, съгласно разработената **НРУД**
  - Оценката на осъществимостта трябва **да информира за възможни промени в приоритизирането на пространствата от данни** въз основа на наличността на данни, качеството на данните и готовността на институциите за управление на данните

## Срокове

- Дейности по Дейност 5: март 2025 г. – декември 2025 г.
- Очаквана крайна дата: 19 месеца след подписването (21 декември 2025 г.)

# Преглед на Дейност 6

## Цел

- **Подробна техническа и процесна пътна карта за разработване на приоритетни пространства от данни въз основа на:**
  - информацията, събрана в предходните компоненти
  - пътната карта на високо равнище за пространствата от данни
  - предложените законодателни и институционални промени
- **Оказване подкрепа на процеса на консултации,** организиран и ръководен от МЕУ

## Срокове

- Дейности по Дейност 6: май 2025 г – декември 2025 г
- Очаквана крайна дата: 19 месеца след подписването (21 декември 2025 г.)

# Деятности 2&4: следващи СТЪПКИ


## **Деятност 2**

- Представяне на секторни доклади за оценка по 9-те сектора на високо ниво
- Представяне на оценка на осъществимостта и препоръки за пилота
- Подготовка на финален доклад: 19 януари 2025

## **Деятност 4**

- Семинар със служители отворени данни и служители по защита на данните, и интервюта с ключови заинтересовани страни
- Проект на НРУД: април 2025

# Благодарим ви!

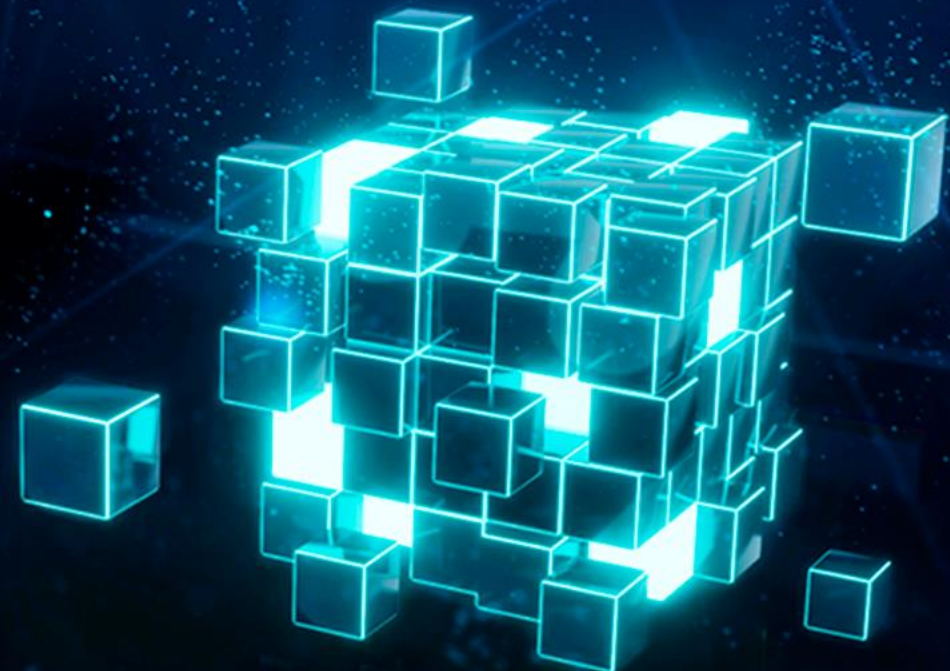

*Проект BG16RFPR002-2.010-0001 „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1) по административен договор № BG16RFPR002-2.010-0001-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран от програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие*
